OBRA	**RINCONADA II XOCHITEPEC**
ATENCION	MESA DIRECTIVA Y ADMINISTRACION
PARTIDA	REMODELACION DE ALBERCA MONUMENTAL

FECHA	martes, 31 de octubre de 2023
CLAVE	C M R -3 8 0

CONSTRUCCIÓN·MANTENIMIENTO·REMODELACIÓN

C A L E N D A R I O D E O B R A

MES: NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL

SEMANAS: SEM 1 (06-11) | SEM 2 (13-18) | SEM 4 (20-25) | SEM 3 (27-02) | SEM 4 (04-09) | SEM 7 (11-16) | SEM 8 (18-23) | SEM 9 (25-30) | SEM 10 (1-6) | SEM 11 (08-13) | SEM 12 (15-20) | SEM 13 (22-27) | SEM 14 (28-03) | SEM 15 (05-10) | SEM 16 (12-17) | SEM 17 (19-24) | SEM 18 (26-02) | SEM 19 (22-27) | SEM 20 (22-27) | SEM 20 (22-27)

CONCEPTO

- DEMOLICIONES - A1
- DEMOLICIONES - A2
- DEMOLICIONES B1
- DEMOLICIONES B2
- DEMOLICIONES C1
- DEMOLICIONES C2
- CIMBRADO Y COLADO - A1
- CIMBRADO Y COLADO - A2
- CIMBRADO Y COLADO B1
- CIMBRADO Y COLADO B2
- CIMBRADO Y COLADO C1
- CIMBRADO Y COLADO C2
- LIMPIEZA GENERAL RETIRO DE MAT.

REG

DIA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE

FIESTAS DE NAVIDAD

FIESTAS DE FIN DE AÑO

TERMINO DE DEMOLICIONES

DIAS: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

SEMANAS: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

CUADRO DE AREAS

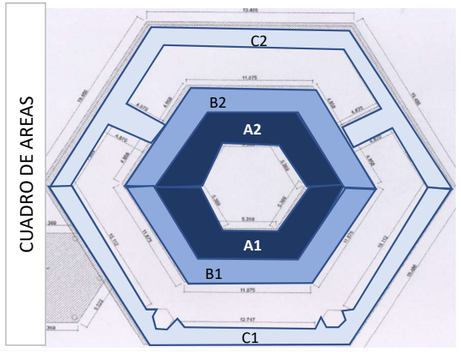

Un trabajo de calidad es el resultado de la experiencia aplicada con responsabilidad
